中井博幸の市議会報告

令和元年6月議会 (第36号)




北大阪急行線延伸事業の遅れについて

ゴールデンウィーク明けの5月7日に、北大阪急行線の開業が3年延期され令和5年度にずれ込むことがニュースで流れました。6月議会の総務常任委員会で、延伸事業の遅れが取り上げられましたので、委員会でのやり取りをもとに、私が知りえた状況を報告させていただきます。

箕面市内の工事の進捗状況は


一部の用地取得がおくれたことで、当該箇所の工事着手が18カ月遅延し、さらに地中からのコンクリート擁壁の出現で、その撤去に3カ月要し、合計で21カ月の遅延が生じたが、コンクリート擁壁の撤去は現時点で完了しています。

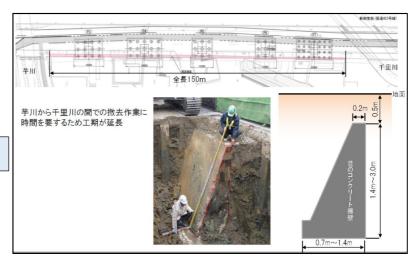

豊中市内の工事の進捗状況は

千里際に、間下がすトぼ工たかを時で、削めりいプな削しかでに、がありいプな削しかでは掘工分めでは掘工分めていた。改成ではった。改成ではった。

すると、この際に設置した土留め壁が延伸ルート上の駅北側に存置し、この土留め壁上部には千里中央駅周辺の建物が建設されていることが判明しました。当初はシールドトンネル工法で千里中央駅のコンクリート部分も削り込み現存するトンネルと直結する予定でしたが、この土留め壁をシールドマシーンで潰そうとすると上部の建物にも影響し、ひい



者への工事の概要説明を行います。周辺の方々への説明が、まだ1年以上必要なことから、令和2年度の下半期から壁の撤去作業を開始できることを目標に調整を進めています。また、撤去作業は既存の千里中央駅終端部からの工事になることから、地下鉄の営業時間後にしか作業ができないので、約17カ月を要するので、約3年遅れるとのことです。

工事の変更で、建設費はどれ程増えるのか

箕面市工区のコンクリート擁壁の撤去費は、約1億5,000万円程度、千里中央駅北側の土留め壁の撤去費は、約3億円程度と試算しています。一方、箕面市が工事を発注した際に約20億円の入札差金があります。また、北大阪急行電鉄が発注したシールド

トンネル工事でも約60億円の入札差金があります。 「コンクリート擁壁や、千里中央駅北側の土留め擁 壁の撤去工事で増額となる事業費などは、合計約 80億円の入札差金で吸収できるので、総事業費650 億円を超えることはない」との答弁でした。

北大阪急行線の開業が3年遅れることでの主な影響は

鉄道開業の延期に伴います箕面船場阪大前駅周辺のまちづくりへの影響は、 図書館、文化ホール、生涯学習センター、地下駐車場などの複合公共施設や駐車場をどのずッキ、デッキ下駐輪場は整備工事に影響はなく、当初の予定どおり令和3年春の竣工を予定し、エ



ントランス、駅前広場、 駅舎駐輪場は、鉄道工事 の進捗の影響を受ける ため、令和5年度、2023 年度の鉄道開業までの 竣工を予定している。大 阪大学の新キャンパス 移転は、当初予定の令和 3年、2021年4月の開校 を予定しています。

開業が遅れることへの手立ては

文化ホールは、遠方からのご来場も見込まれるため、 鉄道開業までの間は既存の路線バス等の公共交通 による来場をご案内します。特に、文化ホールでの 大規模なイベント開催時など、市内外から一度に大 勢の利用客が予想される場合につきましては、今後 ホール運営事業者と協議、調整し、対応策を検討します。大阪大学への通勤・通学等の交通手段につきましては、現在大阪大学で代替案を検討されており、市として協力できる部分については、今後大阪大学と協議していきます。

委員会を傍聴していて思った事

北大阪急行線の延伸事業は、箕面市が施工する部分と北大阪急行(株)が施工する部分に分かれています。箕面市は令和 2 年度内の開業に間に合わせることを目的として取り組んできた結果、多少の遅れは出ているものの、大きくずれることは無いと思いました。一方、北大阪急行(株)が施工する部分に

は、建物の基礎に組み込まれた土留め擁壁という埋設物が出てきたことに加え、現地での工事説明などの初動作業が遅れていることは否めません。今後は、地下鉄延伸工事や運行で影響を受ける方々に丁寧な説明を行い、納得していただいたうえで、焦らず安全な体制で工事を進めてもらいたいと思います。

6 月議会の一般質問は、地区防災委員会の活動を取り上げました



地区防災委員会と議会との意見交換が行われた中で、地区防災委員会の活動が避難所の運営に偏って

しまい、生き埋め状態の人の救助や初期消火が軽視されているように感じましたので、

『市は、地震直後の災害対応体制を再点検し、改めて地区防災委員会をはじめ、各種団体に地震直後に消火・救助活動の重要性の周知を行う必要があるのではないか』

『1月17日に行う全市一 斉防災訓練の内容を、避難 所の運営に偏った訓練では なく、救助や消火活動も取

り入れた訓練に見直す必要はないのか』と、質問しました。

箕面市政に関することは**箕面市議会議員 中井博幸** にご相談ください 住所 箕面市桜4-7-28 電話721-3230 Fax722-8582
